



Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità in zona artigianale (Legge 145/2018) – CUP H57H19000050005

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 08/03/2019

Il Tecnico
(geom. GIANNI Regeni)

Ufficio Tecnico - LL.PP. Patrimonio e Servizi Manutentivi
via Tomadini, 15 - tel.0432 766020 int.7 - mauro.zanin@com-talmassons.regione.fvg.it

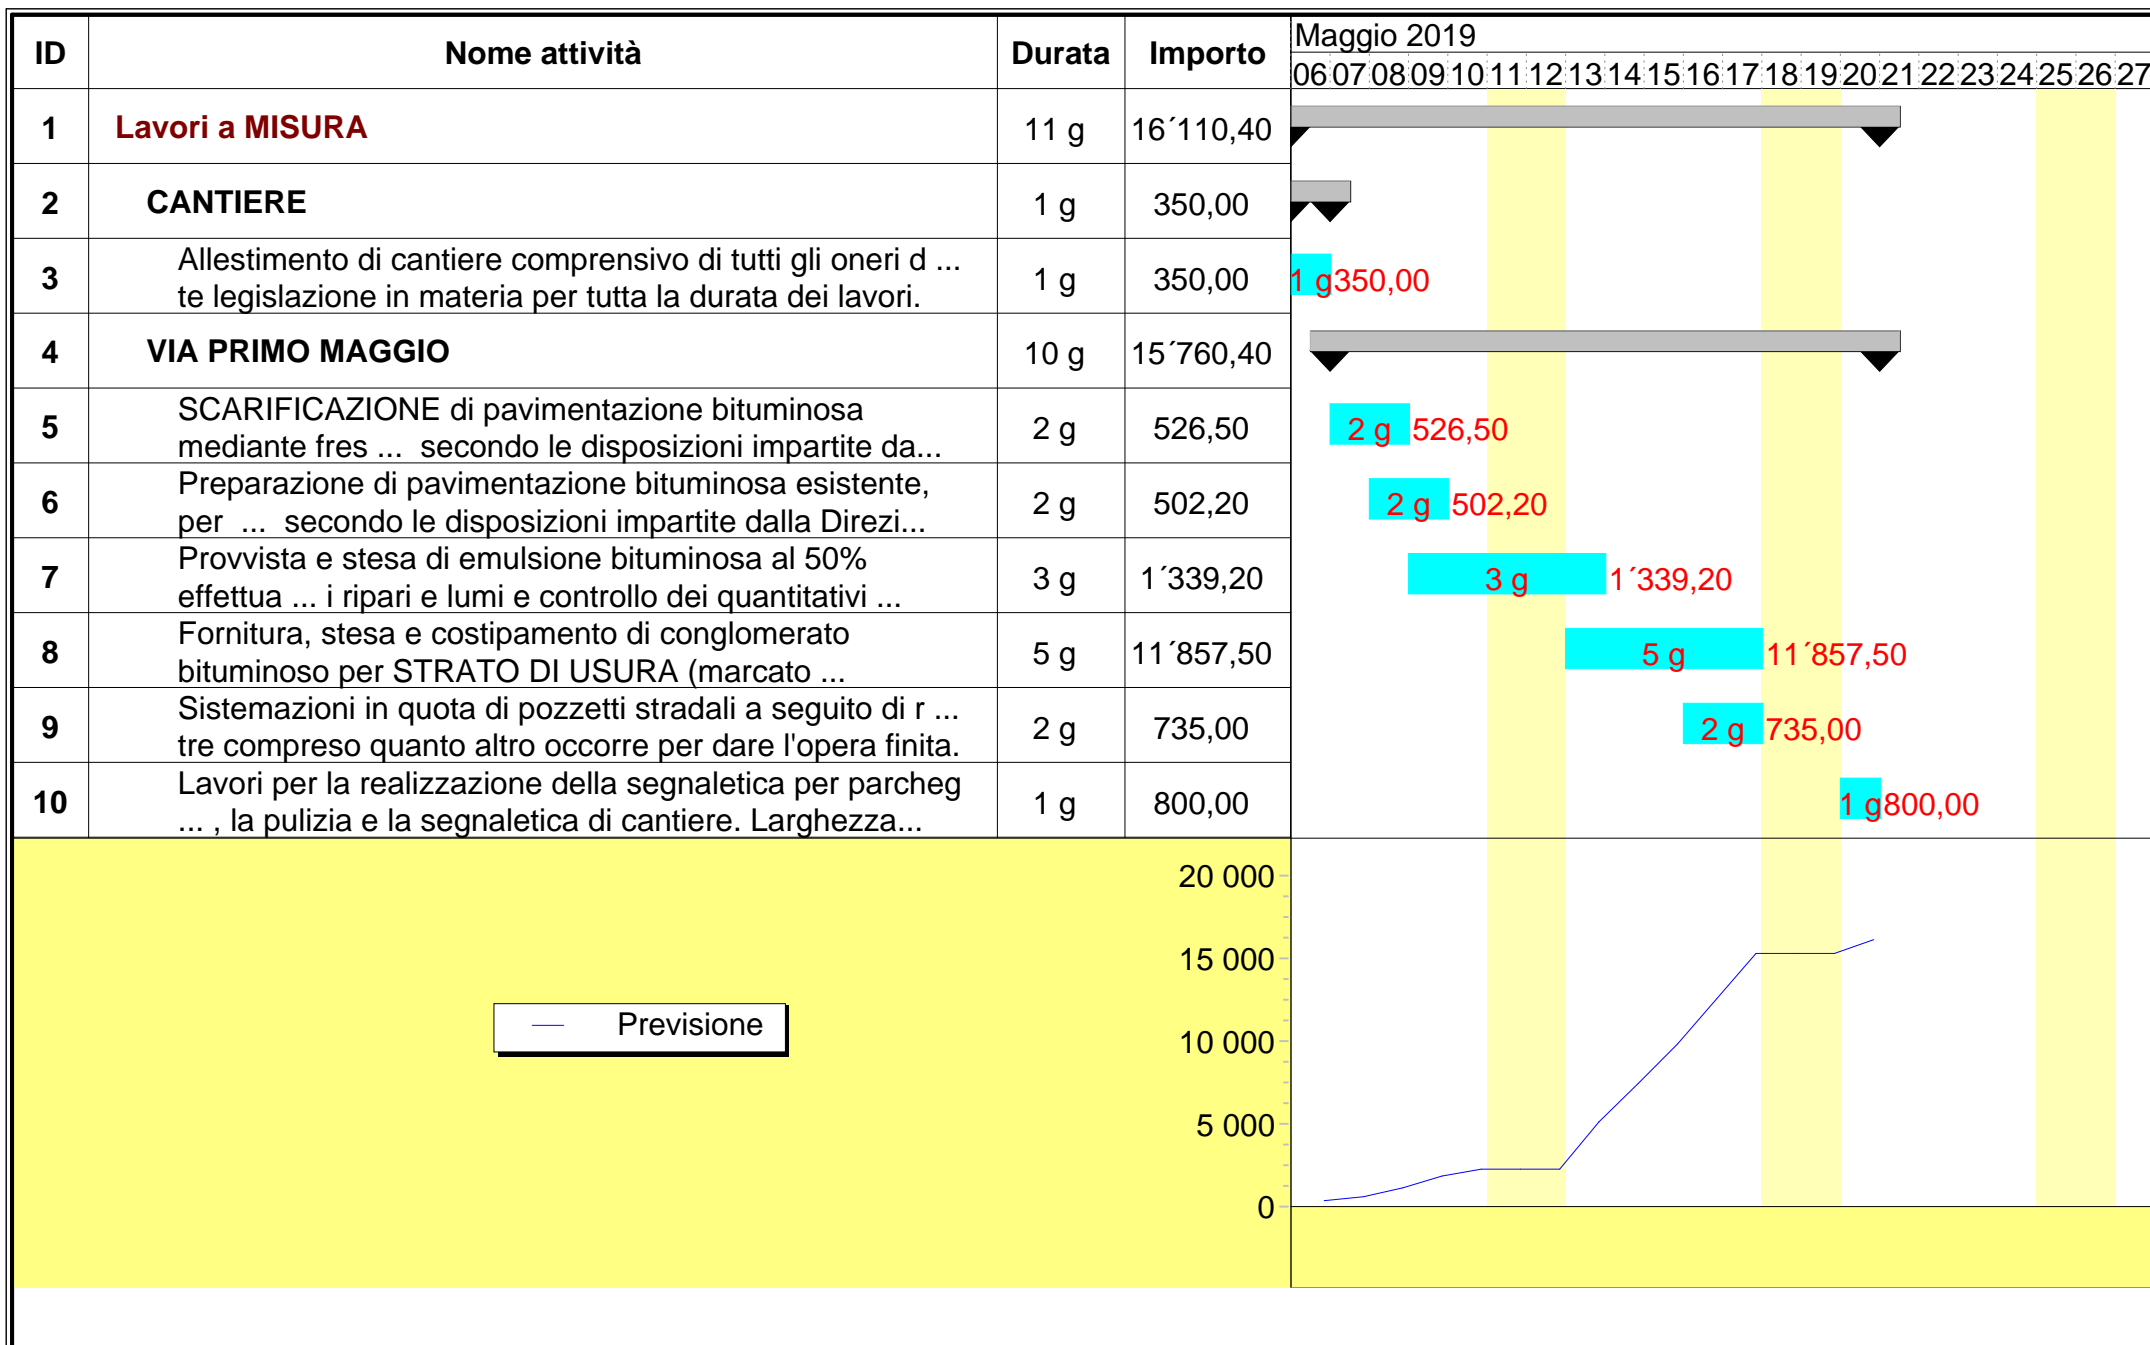



Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità in zona artigianale (Legge 145/2018) – CUP H57H19000050005

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 08/03/2019

Il Tecnico
(geom. GIANNI Regeni)

Ufficio Tecnico - LL.PP. Patrimonio e Servizi Manutentivi
via Tomadini, 15 - tel.0432 766020 int.7 - mauro.zanin@com-talmassons.regione.fvg.it

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	EURO	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	16'110,40	100,00	06/05/2019	20/05/2019	11	15
* CANTIERE	350,00	2,17	06/05/2019	06/05/2019	1	1
* * Allestimento di cantiere comprensivo di tutti gli oneri d ... te legislazione in materia per tutta la durata dei lavori.	350,00	2,17	06/05/2019	06/05/2019	1	1
* VIA PRIMO MAGGIO	15'760,40	97,83	07/05/2019	20/05/2019	10	14
* * SCARIFICAZIONE di pavimentazione bituminosa mediante fres ... secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.	526,50	3,27	07/05/2019	08/05/2019	2	2
* * Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per ... secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.	502,20	3,12	08/05/2019	09/05/2019	2	2
* * Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 50% effettua ... i ripari e lumi e controllo dei quantitativi per ricarichi	1'339,20	8,31	09/05/2019	13/05/2019	3	5
* * Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 30 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 o B70/100 nel periodo invernale, tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. Spessore compreso di 30 mm	11'857,50	73,60	13/05/2019	17/05/2019	5	5
* * Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	735,00	4,56	16/05/2019	17/05/2019	2	2
* * Lavori per la realizzazione della segnaletica per parcheg ... , la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm	800,00	4,97	20/05/2019	20/05/2019	1	1
Talmassons, 08/03/2019						
Tecnico geom. GIANNI Regeni						



Comune di Talmassons

Provincia di Udine

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della viabilità in zona artigianale (Legge 145/2018) – CUP H57H19000050005

COMMITTENTE: Comune di Talmassons

Talmassons, 08/03/2019

Il Tecnico
(geom. GIANNI Regeni)

Ufficio Tecnico - LL.PP. Patrimonio e Servizi Manutentivi
via Tomadini, 15 - tel.0432 766020 int.7 - mauro.zanin@com-talmassons.regione.fvg.it

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale EURO	Progressivo EURO	(%)
06/05/2019	350,00	350,00	2,17
07/05/2019	263,25	613,25	3,81
08/05/2019	514,35	1'127,60	7,00
09/05/2019	697,50	1'825,10	11,33
10/05/2019	446,40	2'271,50	14,10
13/05/2019	2'817,90	5'089,40	31,59
14/05/2019	2'371,50	7'460,90	46,31
15/05/2019	2'371,50	9'832,40	61,03
16/05/2019	2'739,00	12'571,40	78,03
17/05/2019	2'739,00	15'310,40	95,03
20/05/2019	800,00	16'110,40	100,00
Talmassons, 08/03/2019			
Tecnico geom. GIANNI Regeni			
